ZMLUVA O DIELO č. 8/2026

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ..Obchodný zákonník") medzi týmito zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Ochodnica**
Sídlo:	Ochodnica č.121, 023 35 Ochodnica
IČO:	00314153
DIČ:	2020553161
Štatutárny orgán:	p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
IBAN:	SK76 0200 0000 0000 1122 3322

Osoby oprávnené za objednávateľa:
- konať vo veciach technických a realizácie: Ing. Milan Mečár , tel.: +421 911 922 821, milan.mecar@ochodnica.sk

(ďalej len „Objednávateľ")-

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV**
Sídlo:	Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica
IČO:	22605789
DIČ:	1129970039
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Šutý
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK57 0200 0000 0005 2744 9322

Osoby oprávnené za objednávateľa:
- konať vo veciach technických a realizácie: Ing. Pavol Šutý, tel.:+421 905 556 370, ekostav@ekostavoscadnica.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ")

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať pre objednávateľa nižšie uvedené dielo a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu dohodnutú v tejto zmluve.

2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje pre objednávateľa stavbu: **Ochodnica – opravy asfaltového krytu miestnych komunikácii, pozostávajúci z celoplošnej opravy miestnej komunikácie od RD 515 po RD 525 a lokálnych opráv na rôznych miestach miestnych komunikácii v obci, špecifikovaných v prílohe 4.2 (ďalej len „dielo").**

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo:
- stavebné práce podľa technického riešenia a cenovej ponuky zo 14.07.2026

2.4 Podkladom technického riešenia bolo zadanie objednávateľa, špecifikácia miest miestnych komunikácii s poškodeným krytom uvedených v prílohe č.4.1-4.3 a obhliadka navrhnutých miest.

2.5 Súčasťou diela je aj záväzok zhotoviteľa odovzdať objednávateľovi všetky doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu najneskôr ku dňu odovzdania diela.

2.6 Miesto vykonania a odovzdania diela je KU Ochodnica, okres Kysucké Nové Mesto

III. Termíny plnenia

3.1 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia:
Začiatok vykonávania diela: 14.09.2026
Ukončenie prác: 30.10.2026
Odovzdanie diela vrátane dokladov) : 11.11.2026

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred termínom začiatku vykonávania diela. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční zápisom do stavebného denníka poverenými osobami.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi plnenia po dobu. po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, najmä, nie však výlučne neskorým odovzdaním staveniska. V tomto prípade sa dohodnuté termíny plnenia predlžujú o túto dobu.

3.4 V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.

3.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela.

IV. Cena diela a platobné podmienky

4.1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán a je určená položkovým rozpočtom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z., ako maximálna cena a predstavuje:

Celková cena: 39 920,14 Eur bez DPH
DPH 23%: 9 181,63 Eur
Celková cena za dielo: 49 101,77 Eur s DPH
(slovom štyridsaťdeväťtisícstonulajedna eur semdesiatsedem eurocentov)

Záväzný položkový rozpočet cenovej ponuky je prílohou č.3.

4.2. Zhotoviteľ určil cenu na základe podkladov, ktoré mu boli poskytnuté k vypracovaniu položkového rozpočtu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v priloženom položkovom rozpočte sú zahrnuté všetky práce potrebné na riadne zhotovenie Diela v zmysle platných predpisov a noriem. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť a úplnosť rozpočtu. Ak vznikne potreba naviac prác, ktoré nie sú predmetom Diela, Zhotoviteľ tieto naviac práce vykoná po dohode s Objednávateľom a Objednávateľ predmetné naviac práce uhradí na základe podpísaného dodatku k zmluve. Za naviac práce sa nepovažujú práce, ktoré mali byť predmetom Diela ale Zhotoviteľ ich nezahrnul do rozpočtu.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tomto článku tejto zmluvy dohodnutú Cenu Diela podľa skutočne vykonaných prác a/alebo dodaných dodávok podľa a v súlade s touto zmluvou.

4.4. Cena menej prác, t.j. prác alebo iných plnení, ktoré Zhotoviteľ nevykonal, bude z dohodnutej ceny Diela odčítaná, t.j. Zhotoviteľ nie je oprávnený menej práce zahrnúť do akéhokoľvek súpisu vykonaných prác a nemá nárok na ich zaplatenie.

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť príslušnú faktúru za skutočne vykonané práce po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce uskutočnené. Podkladom pre vystavenie faktúry bude odsúhlasený súpis prác schválený zástupcom objednávateľa pre veci technické a realizáciu. Súpis prác bude predložený na schválenie vždy do 5 kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca. V súpise prác bude dodržané poradie a označenie položiek v súlade s rozpočtom a budú doložené všetky potrebné doklady, atesty a merania.

4.6. Splatnosť faktúry je 15 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi s náležitosťami podľa zákona č.222/2004 Z.z.

4.7. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť preukázateľne doručená objednávateľovi najneskôr tretí deň od svojho vystavenia. Pokiaľ dôjde k omeškaniu, predlžuje sa splatnosť faktúry adekvátne o príslušný počet dní omeškania. Pokiaľ bude faktúra z akéhokoľvek

dôvodu vystavená chybne, je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi túto chybnú faktúru vrátiť. V tomto prípade sa objednávateľ nedostane do omeškania s úhradou fakturovanej ceny. Po doručení opravenej, resp. upravenej faktúry začne plynúť objednávateľovi nová 15-dňová lehota splatnosti fakturovanej sumy.

4.8. Všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prác alebo menej prác, sú zmluvné strany povinné zdokladovať zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku budú obojstranne odsúhlasené Zhotoviteľom a odborným dozorom Objednávateľa.

4.9. Pri zvýšení alebo znížení rozsahu Diela budú zmluvné strany vychádzať z jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke. V prípade, že nebude možné použiť položky z cenovej ponuky, pri návrhu jednotkových cien nových položiek sa bude vychádzať podľa cenníka prác v stavebníctve v štruktúre TSKP (databáza Cenekon) v cenovej úrovni v čase podpísania tejto zmluvy so znížením o 10%. Cenu prác naviac, na základe vypracovaného dodatku k zmluve o dielo a položkovom rozpočte, rozhodne obecné zastupiteľstvo.

V. Podmienky zhotovovania diela

5.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný/ montážny denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať záznamy do stavebného/montážneho denníka odo dňa prevzatia staveniska. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa.

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.

5.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať príslušné bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác a objednávateľ ich vopred odsúhlasil. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vy konával sám.

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie, diela.

5.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, prístupových komunikáciách a ochranu životného prostredia okolitých priestorov vrátane nočného a nedeľného kľudu, ktorý' by mohol ohroziť svojou činnosťou. Na svoje náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť miesto plnenia predmetných prác tak, aby počas vykonávania uvedených prác nebola ohrozená bezpečnosť tretích strán.

5.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do termínu prevzatia vykonaného diela zo strany objednávateľa.

5.8 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy alebo platnými predpismi je objednávateľ oprávnený písomne sa dožadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie týchto vád diela poskytne, je objednávateľ oprávnený práce zastaviť a od zmluvy odstúpiť.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

6.1 Odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom sa vykoná formou preberacieho protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

6.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo v prípade, ak dielo má vady a nedorobky. ktoré bránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s vadami a nedorobkami. ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole a musí byť stanovený termín ich odstránenia. Pokiaľ nebude dodržaný termín odstránenia týchto vád a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu uvedenú v čl. VIIL bod 2. tejto zmluvy.

6.4 Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, jej prílohami, všeobecne záväznými právnymi a technickými predpismi,

6.5 Nedorobkom sa rozumejú okrem iného aj nedokončené práce stanovené touto zmluvou a jej prílohami.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo vzniku škody na diele znáša zhotoviteľ do prevzatia diela objednávateľom.

VII. Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Predmet zmluvy bude 24 mesiacov na dodané zariadenia a 60 mesiacov na prácu odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Predmetu zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné lehoty a ktorých zoznam a záručné lehoty budú uvedené v záručnom liste vystavenom Zhotoviteľom pri odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy.

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Predmetu zmluvy t. j. protokolárnym prevzatím Predmetu zmluvy Objednávateľom a jeho bezrozporového podpísania zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

7.4 Zhotoviteľ sa zaručuje, že celé vykonané dielo bude spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ teda garantuje, že vykonanie diela bude zodpovedať výsledku určenému v tejto zmluve a že si dielo v záručnej dobe zachová najmä dohodnuté, minimálne však obvyklé vlastnosti a dielo bude spôsobilé pre použitie k zmluvnému, inak k obvyklému účelu, Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu diela (t. j. použitý materiál a zariadenia), za konštrukciu dodaných vecí vrátane ich súčastí a príslušenstva a za kvalitu stavby. Po dobu záručnej doby zhotoviteľ garantuje zhotovenie diela odborne a kvalitne pri dodržaní všetkých zákonov, technických noriem.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.

7.6 Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu najneskôr do 10 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom bezodplatne odstrániť. Ak v záručnej dobe vznikne na diele akákoľvek vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný takúto vadu odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní od jej oznámenia objednávateľom.

7.7 V prípade nedodržania lehoty na neodstránenie vady diela v zmysle predchádzajúceho bodu môže objednávateľ vykonať odstránenie vady treťou osobou, V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie vady v plnom rozsahu.

7.8 Objednávateľ je oprávnený vadu diela oznámiť zhotoviteľovi písomne alebo emailom, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní potvrdiť objednávateľovi obsah reklamovanej vadv.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v termínoch plnenia podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v zmysle čl. V. bod 2, tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád v zmysle čl. VI. bod 5. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo a to

za každý aj začatý deň omeškania.

8.4 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za dielo v zmysle ustanovení čl. III. Body a 4. tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.5 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty druhej zmluvnej strane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo na náhradu škody akokoľvek dotknuté. Dojednanie zmluvnej pokuty nemá vplyv na zodpovednosť za škodu, jej uplatňovanie, výšku a právo na jej náhradu.

IX. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených zákonom a touto zmluvou.

9.1 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nedochádza k zrušeniu zmluvného vzťahu od počiatku. Táto zmluva sa pri odstúpení ruší ku dňu odstúpenia, Plnenia, ktoré boli poskytnuté zmluvnými stranami do okamihu vzniku účinkov odstúpenia od tejto zmluvy, nie sú si zmluvné strany povinné vrátiť.

9.1 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy alebo ďalších prípadných nárokov, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať i po účinnom odstúpení od tejto zmluvy.

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka považujú za podstatné porušenie Zmluvy:

- omeškanie objednávateľa s úhradou ceny za dielo o viac ako 30 dní,
- omeškanie objednávateľa s prevzatím riadne dokončeného diela o viac ako 15 dní,
- omeškanie zhotoviteľa so začatím vykonávania diela podľa čl. II. bod la) tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
- omeškanie zhotoviteľa s ukončením diela podľa čl. II, bod 1b) tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
- neodstránenie vád a/alebo nevykonávanie diela riadnym spôsobom v primeranej lehote v zmysle čl. IV. bod. 8 tejto zmluvy.

9.1 V ostatných prípadoch a pochybnostiach sa má za to, že porušenie nie je podstatné.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

10.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiace platné právne predpisy SR.

10.3. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

10.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru).

10.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že by sa nepodarilo poštovnú zásielku doručiť adresátovi na poslednú známu adresu jeho sídla, na fikcii doručenia tak, že účinky doručenia nastanú okamžikom, kedy osoba oprávnená k prevádzkovaniu poštovných služieb vráti odosielateľovi zásielku ako nedoručiteľnú, a to tak z dôvodu, že nebola v úložnej lehote vyzdvihnutá, tak z dôvodu, že sa adresát na mieste svojho sídla nezdržuje či odmietol zásielku prevziať.

10.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Výpis z obchodného/živnostenského registra.

Príloha č. 2: Osvedčenie SKSI o odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúci, UID 15449691 – Ing. Pavol Šutý.

Príloha č. 3: Cenová ponuka zo 19.08..2026.

Príloha č.4 : Zadanie Objednávateľa z 11.06.2026, so špecifikáciou poruchových miest miestnych

komunikácii.

10.7. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme 1 (jedno) vyhotovenie a objednávateľ prevezme 2 (dve) vyhotovenia.

10.8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle,. žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Ochodnici 07.09.2026

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Radoslav Duroška, starosta obce Ing. Pavol Šutý

Príloha č. 1

Výpis zo živnostenského registra

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony

Vedený v registri
Okresný úrad Žilina
Číslo živnostenského registra
502-2912
Obchodné meno
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
IČO
22605789
Miesto podnikania
02301 Oščadnica 19

Predmety podnikania

1. **Lesnícke a inžinierske stavby**
   Deň vzniku oprávnenia
   23.09.1992

2. **Obchodná činnosť v oblasti: stavebného materiálu a dreva**
   Deň vzniku oprávnenia
   23.09.1992

3. **Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností**
   Deň vzniku oprávnenia
   17.02.1995
   Prevádzkarne
   Oščadnica, Lesnícke bytovky 19

4. **Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností**
   Deň vzniku oprávnenia
   17.02.1995
   Prevádzkarne
   Oščadnica, Lesnícke bytovky 19

5. **Vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb**
   Deň vzniku oprávnenia
   18.06.1998

6. **Činnosť stavbyvedúceho: - dopravné stavby - pozemné komunikácie, lesné komunikácie - vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby**
   Deň vzniku oprávnenia
   18.06.1998

7. **Piliarske práce**
   Deň vzniku oprávnenia
   10.01.2005

8. **Približovanie dreva**
   Deň vzniku oprávnenia
   10.01.2005

9. **Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom**

Deň vzniku oprávnenia
26.07.2021
Prevádzkarne
02302 Krásno nad Kysucou, Kysucká Cesta 2

10. **Prípravné práce k realizácii stavby**
Deň vzniku oprávnenia
27.09.2024

11. **Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov**
Deň vzniku oprávnenia
27.09.2024

12. **Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy**
Deň vzniku oprávnenia
27.09.2024

13. **Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave**
Deň vzniku oprávnenia
27.09.2024

Dátum výpisu: 08.10.2025

Príloha č. 2

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!

Dátum a čas vygenerovania: 08.10.2025 o 09:15

Ing. Pavol Šutý

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Oščadnica

UID: 15449691

Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ

Zoznam odborností

PLATNÉ OPRÁVNENIE

Evidenčné č.:	**08124**	**Stavbyvedúci** s rozsahom oprávnenia:
Kategória:		Inžinierske stavby
Podkategória:	21	**dopravné stavby**
Špecifikácia:		**pozemné komunikácie a lesné komunikácie**
Stav odbornosti:		Aktívna od 21.03.1997
Pečiatka:		08124*21-23* Aktívna od 28.08.2002
Osvedčenie:		08124*21-23* Aktívne od 28.08.2002

Evidenčné č.:	**08124**	**Stavbyvedúci** s rozsahom oprávnenia:
Kategória:		Inžinierske stavby
Podkategória:	23	**vodohospodárske stavby**
Špecifikácia:		**hydromelioračné stavby**
Stav odbornosti:		Aktívna od 21.03.1997
Pečiatka:		08124*21-23* Aktívna od 28.08.2002
Osvedčenie:		08124*21-23* Aktívne od 28.08.2002

Príloha č. 3

Odberateľ: obec Ochodnica

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.08.2026

Dodávateľ: Ing. Pavol Šutý- EKOSTAV

Stavba : Oprava asfaltového krytu miestnych komunikácii 2026

REKAPITULÁCIA k Cenovej ponuke

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	množstvo (m2) hr. 7cm	Cenová ponuka bez DPH	DPH 23%	**Spolu vr. DPH**
MK od RD č.515 po RDč. 525 celá cesta dl. 180m po hranicu intravilánu	693,00	26 628,70	6 124,60	**32 753,30**
MK od RD č.699 po DR č. 280	42,67	13 291,44	3 057,03	**16 348,47**
Spolu:		39 920,14	9 181,63	**49 101,77**

Prevzal: Ing. Milan Mečár

Cenová ponuka

Stavba: Oprava asfaltového krytu miestnych komunikácii 2026
Objekt: MK od RD č.699 po DR č. 280

Objednávateľ: obec Ochodnica
Zhotoviteľ: Ing. Pavol Šutý- EKOSTAV
Miesto: Ochodnica

Spracoval: Ing. Pavol šutý
Dátum: 17.8.2026

č.	kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1.	**919735112.S**	**Rezanie asfaltového krytu hr.do 100mm**	m	**114,000**	4,20	**478,80**
		Výkaz výmer 2: 114,000				
2.	**113107142.S**	**Odstránenie asfaltového krytu hr. 70mm, jednotlivé plochy priemerne do 10m2**	m2	**42,665**	18,63	**794,85**
		Výkaz výmer 2: 42,665				
3.	**122302201.S**	**Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 do 100 m3- vybratie podkladu hrúbky 200mm**	m3	**8,533**	33,44	**285,34**
		*Výkaz výmer 1: 42,665*0,20 = 23,080*				
4.	**132401101.S**	**Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo**	m3	**0,360**	141,26	**50,85**
		*Odvodnenie Aco monoblock: 6,00*0,30*0,20 = 0,600*				
5.	**162306102.R**	**Naloženie a vodorovné premiestnenie výkopku-podkladu do 3km so zložením a uložením v obci Ochodnica**	t	**17,786**	8,60	**152,96**
		*Výkaz výmer 2: 23,080*2,00+ 0,60*2,00= 47,360*				
6.	**162501102.S**	**Naloženie a vodorovné premiestnenie vybúraných asfaltov so zložením a uložením na riadenej skládke v Krásne nad Kysucou**	t	**7,317**	14,60	**106,83**
		*Výkaz výmer 2: 42,665*0,07*2,45= 7,317*				
7.	**171203111.R**	**Poplatok za skladovanie zeminy a vybúraných asfaltov na riadenej skládke v Krásne nad Kysucou.**	t	**7,317**	19,00	**139,02**
8.	**181101102.S**	**Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (jednotlivé plochy do 10m3)**	m2	**42,665**	2,85	**121,60**
		Výkaz výmer 1: 42,665				
9.	**564851112.S**	**Podklad z drveného kameniva 0/63 s rozprestretím a zhutnením, urovnaním, po zhutnení hr.200 mm, plochy jednotlivo do 10m2**	m2	**42,665**	24,94	**1 064,07**
		Výkaz výmer 1: 42,665				
10.	**573111114.S**	**Natretie okrajov výtlkov asfaltu emulziou v množstve 1,9kg/m2**	m	**114,000**	3,50	**399,00**
		pol.č.1				
11.	**577174431.U1**	**Obaľované kamenivo AC11 hr. 70mm, plochy do 10m2- RUČNE**	m2	**115,400**	55,56	**6 411,62**
		Výkaz výmer 2: 115,400				

12.	931627110.S	**Zaliatie špár asfaltovou emulziou, jednotlivo do dĺžky 10m**	m	**114,000**	4,40	**501,60**
		pol.č.1				
13.	899331111	**Výšková úprava šupátkových a hydrantových poklopov**	ks	**7,000**	97,00	**679,00**
		Výkaz výmer 2: 6ks+1ks= 7ks				
14.	PRACE1	**Výšková úprava šachty kanalizačného poklopu**	ks	**1,000**	200,00	**200,00**
		Výkaz výmer 2: 1ks				
15.	DOPR.ZNAC.	**Dopravné značeni nájom, opakované rozmiestnenie a odstránenie**	kpl	**1,000**	250,00	**250,00**
16.	935114244.S	**Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO monoblock NW 200 do betónového lôžka z betónu C 16/20**	m	**6,000**	45,00	**270,00**
		6,000m				
17.	*310003100.S*	***Dodávka Betón C 16/20 vrátane dopravy a obstarávacích nákladov***	*m3*	***0,360***	*130,85*	**47,11**
		*6,00*0,30*0,20 = 0,360m3*				
18.	*MAT270035100*	***Dodávka odvodňovacieho žľabu ACO monoblock NW 200 dĺ. 1m s mrežou- 5 ks, 0,5m-1ks vrátane dopravy a obstarávacích nákladov***	*ks*	***5,000***	*215,65*	**1 078,25**
		5ks				
19.	*MAT270035101*	***Dodávka odvodňovacieho žľabu ACO monoblock NW 200 dĺ. 0,5m- čistiaci kus vrátane dopravy a obstarávacích nákladov***	*ks*	***1,000***	*260,54*	**260,54**
		1ks				

Celkom bez DPH	**13 291,44 €**
DPH 23 %	3 057,03 €
Celkom vr. DPH	**16 348,47 €**

Poznámka:

**Uvedené množstvá a práce v cenovej ponuke sú len orientačné, faktúrované budú množstvá a práce podľa skutočnosti na základe meraní a záznamov v stavebnom denníku. Priemerná hrúbka asfaltu v jednotlivých plochách bude vypočítaná podľa spotreby materiálu.*

Stavba: Ochodnica- opravy asfaltového krytu na MK 05.2026
Objekt:

Príloha ZoD č.4.2

Objednávateľ: obec Ochodnica
Zhotoviteľ:
Miesto: Ochodnica

Spracoval za objednáva Ing. Milan Mečár
Dátum: 28.5.2026

Špecifikácia prác č.2 -výkaz výmer

P.č.	Popis miesta realizácie	hr.	dĺžka 1	dĺžka 2	šírka 1	šírka 2	výška pri trojuholníku a lichobežníku	plocha	rezanie/ zalievanie	nezapočítané rezanie/ zalievanie	Podklad z DK	Poklop Š	Poklop H	Poklop Kanalizačný	ECO drain	Poznámka
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m^2]	[m]	[m]	[m^2]	[ks]	[ks]	[ks]	[m]	
1	RD č.487, u Štefana Ságoša, stož.trafostanica	0,07	1,50				1,00	0,750	5,50		0,75					
2		0,07	2,70	2,70	0,90	0,90		2,430	7,20		2,43					
3		0,07	0,60	0,60	1,10	1,10		0,660	2,20		0,66	1				
4		0,07	3,70	3,70	0,30	0,30		1,110	7,40		1,11					
5		0,07	0,20				0,50	0,050	1,20		0,05					
6		0,07			1,20	0,90	0,90	0,945	1,800		0,95					
7	Výšková úprava mreže UV	0,07	0,90	0,90	0,90	0,90		0,810	3,600					1		
8	RD č.595, Vŕšok, žľab ECO drain š.200mm, dĺžka 6,0m, D400 + čistiaci kus + šachta	0,07	6,00	6,00	0,70	0,70		4,200	12,00		4,20				6	
9		0,07	1,60				1,50	1,200	5,30		1,20					
10	RD č.653, MK k pálenici,	0,07	0,70	0,70	0,60	0,60		0,420	2,60		0,42					
11		0,07	0,50	0,50	0,50	0,50		0,250	2,00		0,25					
12	od RD č.699 po RDč.702 (horáreň)	0,07	1,10	1,10	1,00	1,00		1,100	4,20		1,10					
13		0,07	1,60	1,60	0,90	0,90		1,440	3,40		1,44					
14		0,07	1,40	1,40	0,90	0,90		1,260	4,60		1,26					
15		0,07	1,10	1,10	0,60	0,60		0,660	2,30		0,66					
16		0,07	1,00	1,00	0,60	0,60		0,600	2,20		0,60					
17		0,07	1,10	1,10	0,50	0,50		0,550	2,10		0,55					
18		0,07	1,60	1,60	1,60	1,60		2,560	4,80		2,56					
19	MK pri kostole, krajnica	0,07	10,00	10,00	1,00	1,00		10,000	12,00		10,00					
20	RD č.331, u Koptákov	0,07	1,70	1,70	0,80	0,80		1,360	3,30		1,36	1				
21	RD č.330, u Koptákov	0,07	2,20	2,20	0,60	0,60		1,320	3,40		1,32					
22	RD č.283 po oprave hyhrantu Púchovská rieka	0,07	2,30	2,30	0,80	0,80		1,840	3,90			1	1			
23	RD č. 280, Púchovská rieka	0,07	3,50	3,50	0,90	0,90		3,150	7,00		3,15					
24	Rezerva na prípadné zväčšenie rozsahu prác	0,07						4,000	10,00		4,00	3				
	SPOLU							**42,665**	**114,000**	**0,000**	**40,015**	**6,000**	**1,000**	**1,000**	**6,000**	

CENOVÁ PONUKA

Stavba: Oprava asfaltového krytu miestnych komunikácii 2026
Objekt: MK od RD č.515 po RDč. 524 v celkovej dĺžke 180m po hranicu intravilánu

Objednávateľ: obec Ochodnica

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV

Miesto: Ochodnica

Spracoval: Ing. Pavol Šutý

Dátum: 19.8.2026

č.	kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1.	182101102.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	40,000	3,86	154,40
		*"presvahovanie v úseku km 0,13-0,15": 20,00*2,00= 40,000*				
2.	132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,600	141,26	84,76
		*"Odvodnenie Aco monoblock": (5,00+5,00)*0,30*0,20 = 0,600*				
3.	162306102.R	Naloženie a vodorovné premiestnenie výkopku-podkladu do 3km so zložením a uložením v obci Ochodnica	t	1,380	8,60	11,87
		*0,600*2,30 = 1,380*				
4.	564851112.S	Podklad z drveného kameniva 0/63 s rozprestretím a zhutnením, urovnaním, po zhutnení hr.200 mm, plochy jednotlivo do 10m2	m2	115,400	24,90	2 873,46

		Výkaz výmer 1: 115,400				
5.	**577174431.U1**	**Obaľované kamenivo AC11 hr. 70mm**	m2	**693,000**	26,69	**18 496,17**
		180,00(5,00+2,70):2 = 693,000*				
6.	**931627110.S**	**Zaliatie špár asfaltovou emulziou, jednotlivo do dĺžky 10m**	m	**22,700**	4,40	**99,88**
		5,00+2,70+ drobné zálievky okolo poklopov = 22,700				
7.	**899331111**	**Výšková úprava šupátkových a hydrantových poklopov**	ks	**5,000**	97,00	**485,00**
		Výkaz výmer 1: 2ks+3ks= 5ks				
8.	**PRACE1**	**Výšková úprava šachty kanalizačného poklopu**	ks	**3,000**	200,00	**600,00**
		Výkaz výmer 1: 3ks				
9.	**DOPR.ZNAC.**	**Dopravné značeni nájom, opakované rozmiestnenie a odstránenie**	kpl	**1,000**	300,00	**300,00**
10.	**935114244.S**	**Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO monoblock NW 200 do betónového lôžka z betónu C 16/20**	m	**8,000**	45,00	**360,00**
		km 0,017 : 4,000				

km 0,160 : 4,000

SPOLU: 8,000

11.	***310003100.S***	***Dodávka Betón C 16/20 vrátane dopravy a obstarávacích nákladov***	*m3*	***0,480***	*130,85*	**62,81**

*8,00*0,30*0,20 = 0,480m3*

12.	***MAT270035100***	***Dodávka odvodňovacieho žľabu ACO monoblock NW 200 dĺ. 1m s mrežou vrátane dopravy a obstarávacích nákladov***	*ks*	***8,000***	*215,65*	**1 725,20**

km 0,017 : 4,000

km 0,160 : 4,000

SPOLU: 8,000

13.	***MAT270035101***	***Dodávka odvodňovacieho žľabu ACO monoblock NW 200 dĺ. 0,5m- čistiaci kus vrátane dopravy a obstarávacích nákladov***	*ks*	***4,000***	*260,54*	**1 042,16**

km 0,017 : 2,000

km 0,160 : 2,000

SPOLU: 4,000

14.	**212756211.S**	**Montáž odvodnenia z rúr PVC DN 110**	m	**20,000**	0,80	**16,00**
		" km 0,130-0,150" :20,000				
15.	***MAT130038100***	***Dodávka rúra DN 110***	*m*	***20,000***	*3,35*	**67,00**
		20,000				
16.	***PRACE2***	***Napojenie DN 100 do jestvujúcej dažďovej kanalizácie***	*kpl*	***1,000***	*250,00*	**250,00**
		1ks				

Celkom bez DPH	**26 628,70 €**
DPH 23 %	6 124,60 €
Celkom vr. DPH	**32 753,30 €**

Poznámka:

**Uvedené množstvá a práce v cenovej ponuke sú len orientačné, faktúrované budú množstvá a práce podľa skutočnosti na základe meraní a záznamov v stavebnom denníku. Priemerná hrúbka asfaltu v jednotlivých plochách bude vypočítaná podľa spotreby materiálu.*

Príloha č. 4.1

milan.mecar@ochodnica.sk

Od: milan.mecar@ochodnica.sk
Odoslané: štvrtok 11. júna 2026 13:28
Komu: 'suty-est@ekostavoscadnica.sk'
Predmet: Žiadosť o alternatívnu CP na opravu asf. krytu MK Ochodnica
Prílohy: P01_Popis porúch na asf. kryte MK Ochodnica 05.2026.pdf; P02_Zadáv.výkaz výmer č.1 .pdf; P03_Zadáv.výkaz výmer č.2 .pdf; P04_Zadáv.výkaz výmer č.1,2 .xlsx; P05 _Návrh ZoD č.x.2026_Ochodnica_.docx

Dobrý deň,

chcel by som vás požiadať o vypracovanie alternatívnej cenovej ponuky pre zámer Obce Ochodnica (okres Kysucké Nové Mesto):

Opravy asfaltového krytu miestnych komunikácii 2026

Popis zadania prác:
Pre opravy asfaltového krytu miestnych komunikácii boli zdokumentované lokality s najhorším technickým stavom a navrhnuté technické riešenie opráv. Technické riešenie opráv môže uchádzač upraviť.
Pri spracovaní špecifikácie boli vytvorené 2 objekty pre spracovanie cenovej ponuky a to:

1. **Oprava miestnej komunikácie od RD 515 po RD 524** v celkovej dĺžke 160m, (prípadne 180m po hranicu intravilánu), pre lokálne opravy bola vypracovaná špecifikácia č.1.
   Komunikácia má premenlivú šírku od 5m na začiatku upravovaného úseku, zväčša 2,7 m.
   Asfaltový kryt miestnych komunikácie (ďalej skrátene MK) je v zdokumentovaných miestach rozdrobený následkom sieťového rozpadu, povrch vykazuje nerovnosti v pozdĺžnom aj priečnom smere, lokálne sa vytvárajú deformácie podpovrchových a povrchových vrstiev (príloha P01).
   Na MK chýba funkčné podpovrchové a povrchové odvodnenie. V pozdĺžnej osi MK sa nachádza mimo konštrukcie vozovky pravostranná dažďová kanalizácia z betónových rúr DN 300, s provizórnymi 2-4 prekrytiami, ktoré je potrebné nahradiť liatinovými poklopmi D400, prípadne mrežou uličnej vpuste v km 0,017.
   V staničení 0,017 km a 0,160km je potrebné doplniť priečne odvodňovacie žľaby na zachytenie dažďových povrchových vôd.
   V mieste vyznačených porúch navrhujem odkopať a vymeniť podkladnú vrstvu v hrúbke 200mm a nahradiť ju DK 0/63.
   V úseku 0,130 – 0,150 km navrhujem zrealizovať odkovávku zeminy zo svahu 0,5 – 1,0m a zrealizovať presvahovanie. V uvedenom úseku navrhujem realizovať odvodnenie pláne vozovky pravostrannou drenážou z PVC rúr DN 100 a drenáž zaústiť do dažďovej kanalizácie.
   Nový asfaltový kryt vozovky navrhujem z AC11, 70mm. V styku starej a novej asfaltovej vrstvy bude realizovaná zálievka.

   Popis činností na oprávách asfaltového krytu:
   1. Odkopávky zeminy a presvahovanie v úseku km 0,13 – 0,150 , 20x 2,0 x 0, 8m
   2. rezanie asfaltového krytu po obvode poruchy do hrúbky 70-100mm,
   3. odkopávky, nakládka a odvoz asfaltových sutí na riadenú skládku mimo obce,
   4. poplatok za uskladnenie vybúraného materiálu
   5. odkopávky podkladných vrstiev prípadne zeminy hrúbky 200mm, nakládka a odvoz na skládku v obci do zdialenosti 3,0 km,
   6. dodávka materiálu a zhotovenie odvodnenia pláne vozovky v km 0,13 – 0,15 z PVC 100
   7. dodávka materiálu a zhotovenie povrchového odvodnenie betónovými žľabmi s demontovateľnou mrežou. Šírka žľabov bude 200mm,
   8. dodávka materiálu a zriadenie podkladnej vrstvy z drveného kameniva frakcie 0/63 so zhutnením,
   9. výšková úprava šupátkových, hydrantových a kanalizačných poklopov,
   10. dodávka materiálu a zriadenie asfaltovej vrstvy z AC 11, 70mm so zhutnením,
   11. zriadenie asfaltovej zálievky pracovnej špáry

   Alternatívne prosím navrhnúť technické riešenie a oceniť celoplošnú úpravu z AC

2. **Oprava miestnych komunikácii v rôznych častiach obce podľa špecifikácie č.2**

V prílohe správy nájdete súbory :

1. P01_Popis porúch na asf. kryte MK Ochodnica 05.2026. pdf
2. P02_Zadáv. výkaz výmer č.1. pdf
3. P03_Zadáv. výkaz výmer č.2. pdf
4. P04_Zadáv.výkaz výmer č.1, 2. xls
5. P05_Návrh ZoD č.x.2026_Ochodnica_.docx

Predpokladaný termín realizácie prác: jjúl, august 2026. (prípadne uveďte v akom termíne budete mať voľné výrobné kapacity)
Forma obchodného vzťahu: zmluva o dielo so záväznými jednotkovými cenami
Fakturačné a platobné podmienky: fakturácia 1x mesačne podľa skutočne vykonaných prác, splatnosť faktúr do 15 prac. dní od doručenia.
Dátum vypracovania CP: utorok 16.6.2026

V prípade nejasností a vykonania obhliadky ma prosím kontaktujte. Prosím o spätnú väzbu, či nám cenovú ponuku vypracujete.

S pozdravom

Ing. Milan Mečár
predseda Komisie stavebnej, dopravy a územného rozvoja pri OZ Ochodnica
Te. +421 911 922 821
e-mail: milan.mecar@ochodnica.sk

Príloha č. 4.2

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum: 27. 7. 2026

Obec Ochodnica - Návrh celo-plošnej opravy MK 180m, šírka 3,85m

Parcela registra C, 2162

Žilinský > Kysucké Nové Mesto > Ochodnica > k.ú. Ochodnica

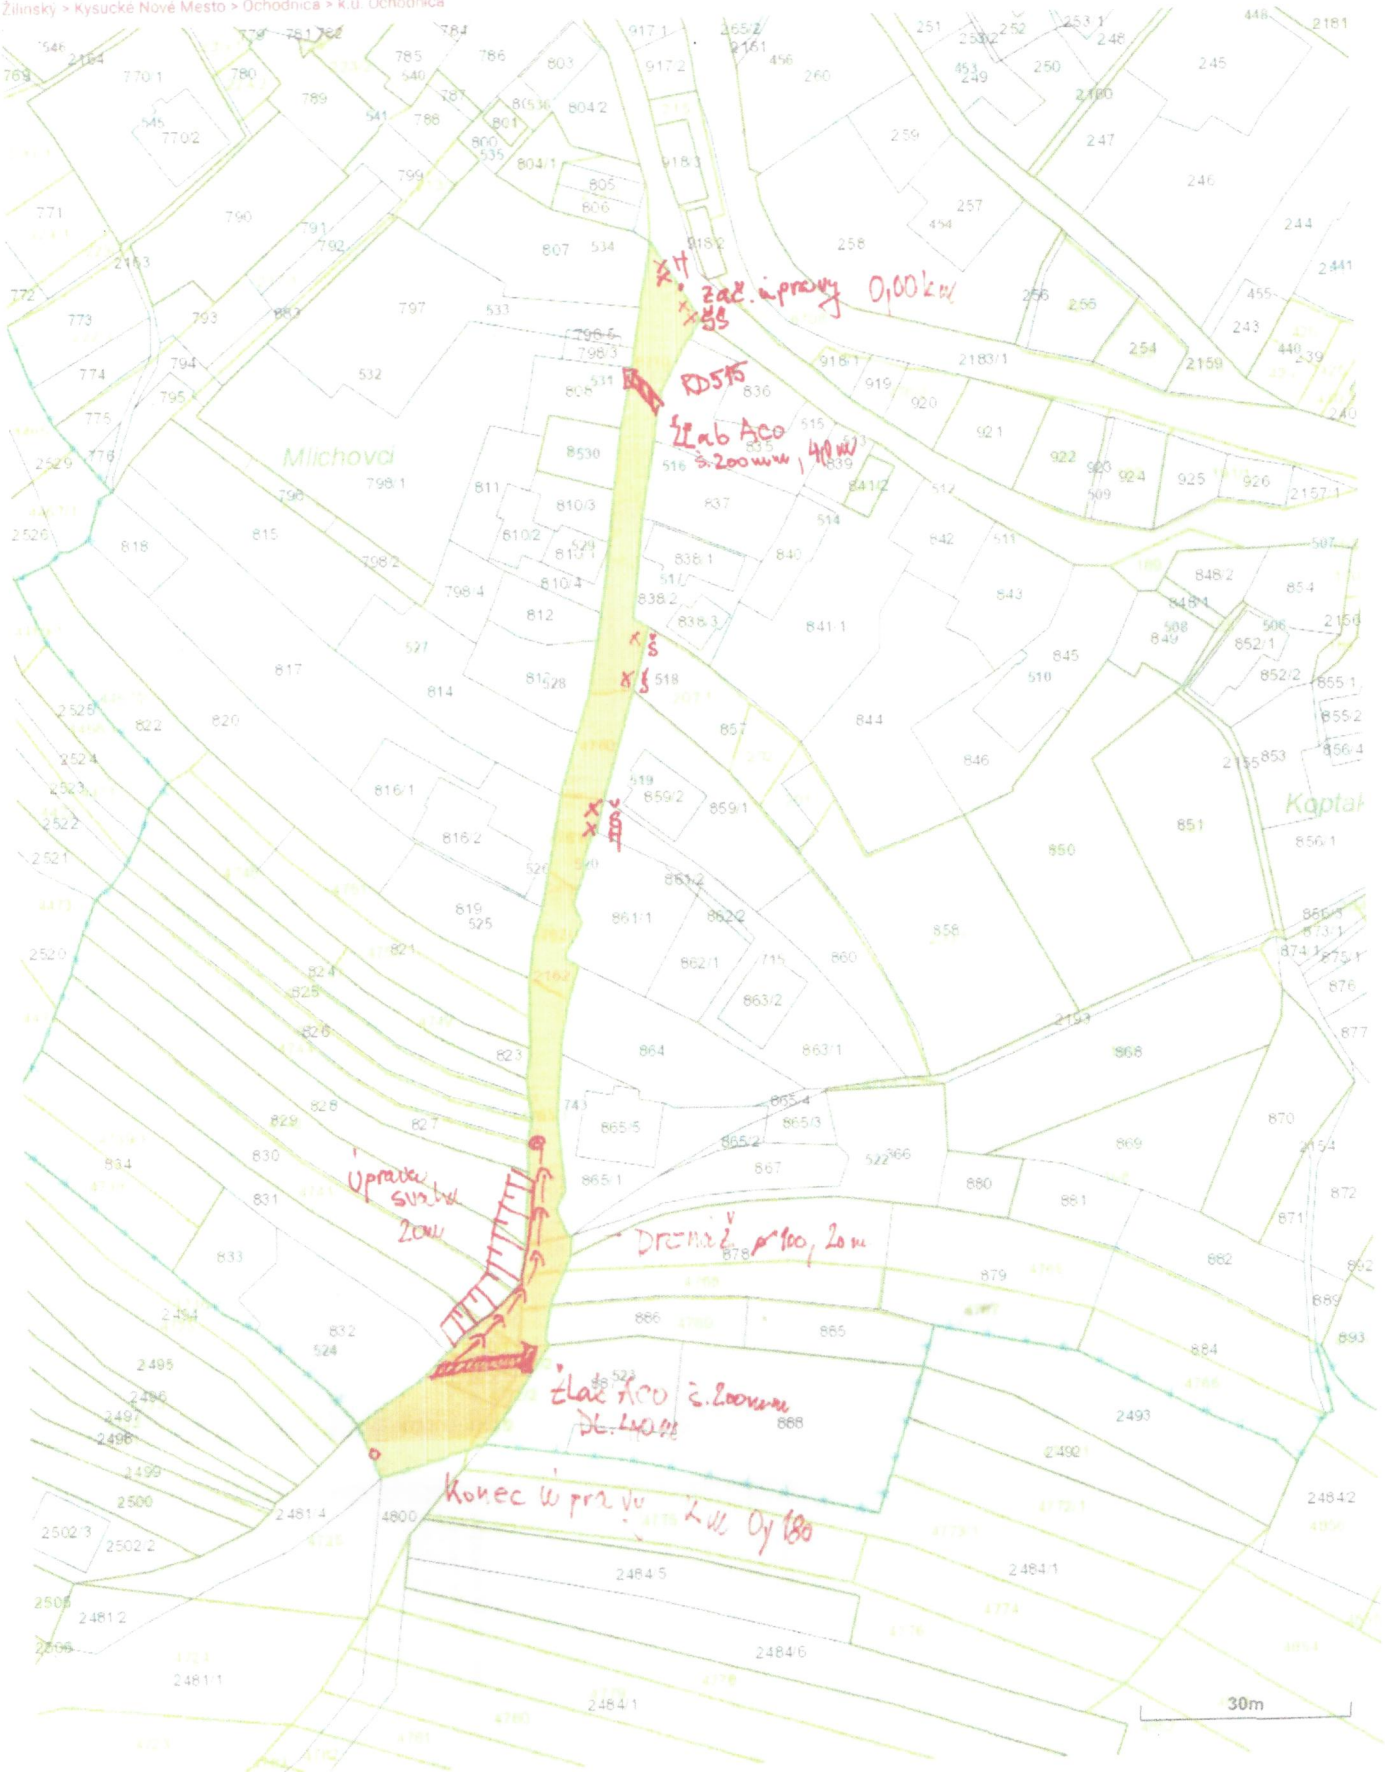

Vytlačené z aplikácie MAPKA. Nepoužiteľné na právne úkony.

Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

/ osadenie stavieb na

27. 7. 2026

Príloha ZoD č 4.3

Stavba: Ochodnica- opravy asfaltového krytu na MK 05.2026

Objekt:

Objednávateľ: obec Ochodnica
Zhotoviteľ:
Miesto: Ochodnica

Spracoval za objednávateľa: Ing. Milan Mečár
Dátum: 28.5.2026

Špecifikácia prác č.2

P.č.	Popis miesta realizácie	Pôdorysný tvar	hr.	dĺžka 1	dĺžka 2	šírka 1	šírka 2	výška pri trojuholníku a lichobežníku	plocha	rezanie/ zalievanie	nezapočítané rezanie/ zalievanie	Podklad z DK	Poklop Š	Poklop H	Poklop Kanalizačný	ECO drain	Poznámka
			[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m^2]	[m]	[m]	[m^2]	[ks]	[ks]	[ks]	[m]	
1	RD č.487, u Štefana Ságoša, stož.trafostanica	trojuhulník	0,07	1,50				1,00	0,750	5,50		0,75					
2			0,07	2,70	2,70	0,90	0,90		2,430	7,20		2,43					
3			0,07	0,60	0,60	1,10	1,10		0,660	2,20		0,66	1				
4			0,07	3,70	3,70	0,30	0,30		1,110	7,40		1,11					
5		trojuhulník	0,07	0,20				0,50	0,050	1,20		0,05					
6		lichobežník	0,07			1,20	0,90	0,90	0,945	1,800		0,95					
7	Výšková úprava mreže UV		0,07	0,90	0,90	0,90	0,90		0,810	3,600					1		
8	RD č.595, Vŕšok, žľab ECO drain š.200mm, dĺžka 6,0m, D400 + čistiaci kus + šachta		0,07	6,00	6,00	0,70	0,70		4,200	12,00		4,20				6	
9		trojuhulník	0,07	1,60				1,50	1,200	5,30		1,20					
10	RD č.653, MK k pálenici,		0,07	0,70	0,70	0,60	0,60		0,420	2,60		0,42					
11			0,07	0,50	0,50	0,50	0,50		0,250	2,00		0,25					
12	od RD č.699 po RDč.702 (horáreň)		0,07	1,10	1,10	1,00	1,00		1,100	4,20		1,10					
13			0,07	1,60	1,60	0,90	0,90		1,440	3,40		1,44					
14			0,07	1,40	1,40	0,90	0,90		1,260	4,60		1,26					
15			0,07	1,10	1,10	0,60	0,60		0,660	2,30		0,66					
16			0,07	1,00	1,00	0,60	0,60		0,600	2,20		0,60					
17			0,07	1,10	1,10	0,50	0,50		0,550	2,10		0,55					
18			0,07	1,60	1,60	1,60	1,60		2,560	4,80		2,56					
19	MK pri kostole, krajnica		0,07	10,00	10,00	1,00	1,00		10,000	12,00		10,00					
20	RD č.331, u Koptákov		0,07	1,70	1,70	0,80	0,80		1,360	3,30		1,36	1				

P.č.	Popis miesta realizácie	Pôdorysný tvar	hr.	dĺžka 1	dĺžka 2	šírka 1	šírka 2	výška pri trojuholníku a lichobežníku	plocha	rezanie/ zalievanie	nezapočítané rezanie/ zalievanie	Podklad z DK	Poklop Š	Poklop H	Poklop Kanalizačný	ECO drain	Poznámka
			[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m^2]	[m]	[m]	[m^2]	[ks]	[ks]	[ks]	[m]	
21	RD č.330, u Koptákov		0,07	2,20	2,20	0,60	0,60		1,320	3,40		1,32					
22	RD č.283 po oprave hyhrantu Púchovská rieka		0,07	2,30	2,30	0,80	0,80		1,840	3,90			1	1			
23	RD č. 280, Púchovská rieka		0,07	3,50	3,50	0,90	0,90		3,150	7,00		3,15					
24	Rezerva na prípadné zväčšenie rozsahu prác		0,07						4,000	10,00		4,00	3				
	SPOLU								**42,665**	**114,000**	**0,000**	**40,015**	**6,000**	**1,000**	**1,000**	**6,000**	
